

雲林縣採購中心

工程施工查核 執行情形簡報

報告人：曾智麟

中華民國 110 年 02 月 23 日

110年01月查核案件(1)

➤ 1月份總計查核8件，甲等7件、乙等1件，甲等比例**87.5%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	虎尾周邊街道系統 整合串接改善計畫 第二期工程	本府工務處	68,837	89.88%	橙谷景觀規 劃設計有限 公司	北鄉營造 有限公司	0	0	85	鄭仁傑 技正
			59,500	89.9%						
2	斗六市雲科路三段 竹圍大橋火害緊急 復建工程	本府工務處	14,737	67.52%	翊盛工程顧 問有限公司	義力營造 股份有限 公司	0	0	85	鄭仁傑 技正
			14,500	80.82%						
3	延潭大排仁剛橋上 游治理工程	本府水利處	96,499	40.46%	源隆技術顧 問有限公司	廣裕營造 工程有限 公司	0	0	82	吳文能 副處長
			94,220	40.68%						
4	口湖鄉新港大排二 1k+510中上游段排 水復建工程	口湖鄉公所	7,501	100%	磐禹工程顧 問有限公司	億榮營造 股份有限 公司	0	0	81	孫連成 課長 ₂
			7,385	100%						

110年01月查核案件(2)


➤ 1月份總計查核8件，甲等7件、乙等1件，甲等比例**87.5%**。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位 (出席代表)	承攬廠商 (出席代表)	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	斗六市大潭排水復 建工程	本府水利處	8,527	45.43%	源隆技術顧 問有限公司	尚業營造 工程有限 公司	0	0	81	吳文能 副處長
			6,820	54.95%						
6	滴仔1號滯洪池新建 工程	本府水利處	77,091	100%	源隆技術顧 問有限公司	友土營造 有限公司	0	0	80	吳文能 副處長
			62,220	87.58%						
7	雲林縣斗南田徑場 整修工程	雲林縣立體育 場	57,491	99.28%	楊雪雲建築 師事務所	久木營造 有限公司	0	0	80	賴俊嘉 場長
			57,000	99.69%						
8	口湖鄉中正路共同 管溝暨周邊人行環 境改善工程(一期)	口湖鄉公所	65,126	67.56%	信創工程顧 問有限公司	中大興營 造有限公 司	5	5	76	孫連成 課長 5
			63,800	66.39%						

110年度查核成績統計

1月份查核共8件，成績評定甲等共7件，比例達**87.5%**

	查核件數	甲等	乙等	備註
本府暨所屬機關	6	6	0	本府工務處-2甲 本府水利處-3甲 雲林縣立體育場-1甲
公所	2	1	1	口湖鄉公所-1甲1乙

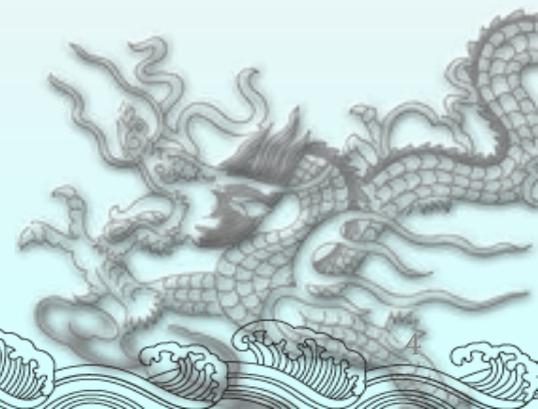

主辦單位常見缺失

期間：自110年01月01日至110年01月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.01.06	監造計畫未確實審查。	請確實依各章節審查表審查，必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。
2	4.01.04	督導紀錄內容未詳實。	建議由具工程實務經驗之同仁協助督導，或聘請專家學者協助辦理督導，以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點，請各單位確實據以執行。
3	4.01.13	標案管理系統資料填報不完整。	標案管理系統中，有關保險單號碼、各種計畫核定文號、相關人員登錄，請確實依相關規定確實填列。
4	4.01.05	督導缺失未落實追蹤。	依缺失之嚴重性及重要性，訂出合理之改善期限，令廠商改善，其改善期限若逾期，請依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，予以扣罰。

監造單位常見缺失

期間：自110年01月01日至110年01月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.02.03.04	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落實管控材料設備檢(試)驗管制總表。	施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單辦理，並確實將抽查結果量化，再判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗項目及數量，確實執行。
2	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限是否符合需求	監造單位確實審查廠商之品質計畫及施工計畫，應確實依監造計畫編寫。
3	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求監造單位據以執行。
4	4.02.03.05	未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，相關工地安全衛生、交通維持及環境保護工作監造單位若不落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。
5	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。	於審查相關計畫書時，聘請具工程實務經驗之專家學者，協助審查基造計畫架構是否包括品管要點規定之基本內容

承攬廠商常見缺失

期間：自110年01月01日至110年01月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行。	落實主辦機關督導及監造單位抽查，要求廠商確實執行。
2	4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表未落實記載。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求專任工程人員每月確實至少填報1次。
3	4.03.01	施工計畫內容未落實執行。	於審查施工計畫時，聘請具工程實務經驗之專家學者協助審查，以符合工程需要。
4	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	於審查相關計畫書時，聘請具工程實務經驗之專家學者，協助審查是否訂定其各工項之施工品質管理標準。
5	4.03.03	施工日誌未落實填報。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表辦理，要求廠商據以執行。



施工品質常見缺失

期間：自110年01月01日至110年01月31日

總件數 8件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	混凝土澆置前須規劃好時程，避免冷縫產生，澆置後請確實做好震動搗實工作，避免產生蜂窩、孔洞。
2	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	混凝土澆置完成後應確實灑水養護。
3	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範。	混凝土澆置前須規劃好時程，澆置後請確實做好震動搗實工作，並以鏟刀鏟平。
4	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	預定完工日期、補助單位經費來源、政風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與監造單位確實督促廠商確實。
5	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	主辦機關落實督導及監造單位落實抽查。



結語

✓110年1月份查核甲等比例為**87.5%**，顯見各單位都非常重視工程品質的管控，希望能繼續努力，保持優良成績。

✓本府預計109年3月8日(星期一)辦理110年公共工程品質管理研習會(一)，邀請內政部營建署南區工程處-正工程司兼副處長林瑞德委員講習「參選金質獎、金安獎整備及注意事項(6hr)」，請各單位踴躍參與。

簡報完畢
敬請指教

