雲林縣採購中心

工程施工查核執行情形簡報

報告人:曾智麟主任 中華民國111年11月22日



111年9月查核案件(1)

▶9月份總計查核8件,甲等5件、乙等3件,甲等比例63%。

序		登包預算 預定進度 (千元) 類定進度 工程名稱 主辦單位 (千元) 監造單位	. 	承攬廠商		監造	評分	受查單 位參與		
號	11 1 1 1 1 H	工册丰山	決標預算 (千元)	實際進度	血色丰位	子()克 (())((i)	扣點	扣點	BT 7J	人員
1	斗六市紫藤湖生態園區 四湖上第五新開北美工	雲林縣	5,160	100.00%	永澍景觀股	齊全土木 包工業(雲			81	72/ 0丁 (17)
1	環湖步道及護欄改善工程	斗六市公所	5,665	99.74%		林縣)			ΟŢ	孫旺田
2	文安國小111年度運動	雲林縣斗南	6,325	25 35.51% 呂罡銘建築		久木營造			81	
2	操場及周邊設施整建工 程 	鎮文安國民 小學	6,325	39.64%	師事務所	有限公司			81	曾智豐
2	南公館公墓納骨塔裝修	雲林縣	41,443	88.00%	楊宗睆建築	發發發有 限公司			01	丁 <i>/</i> 李响
3	工程	臺西鄉公所	34,462	89.44%	師事務所				81	丁偉鵬
4	後庄埤滯洪排水設施環	雲林縣政府	46,904	39.65%	新光工程顧	七工程顧 臻晟營造			00	↓↓ ⊟ Ē汉
4	境改善計畫	水利處水利 工程科	41,000	39.88%	問有限公司	有限公司			80	林昆賢



111年9月查核案件(2)

▶9月份總計查核8件,甲等5件、乙等3件,甲等比例63%。

序	工程名稱	 主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	· 監造單位	 承攬廠商	廠商	監造	評分	受查單 位參與
號	TIE 11111		決標預算 (千元)	實際進度		分 划免例X1回	扣點	扣點	ĦΓŹĴ	人員
	雲林縣斗六市梅南路、 榮譽路及仁義路四巷人	雲林縣	65,278	41.50%	柏和土木結	冠貹營造				
5		斗六市公所	62,008	39.05%		股份有限 公司	1	1	80	傅騰標
	 麥寮鄉橋頭村泰安宮周	雲林縣 麥寮鄉公所	25,115	79.20%		楠峰營造 股份有限 公司	4	4	77	新知伽
6	邊環境改善計畫		23,820	82.30%				4	77	戴淑卿
7		雲林縣林內 鄉九芎國民	7,333	17.33%	李仁智建築	隆盈營造 股份有限	1		77	林怡君
/	場及周邊設施整建計畫 工程 	郷ル号圏氏 小學 	7,333	35.67%	12111 	公司	I		77	1111日1日
8		雲林縣土庫 鎮越港國民 小學	13,015	91.00%	1EIII 704 ULT	士耕室內 裝修設計 有限公司	2	2	75	喬祺
8			13,015	89.62%			۷	۷	7.5	



111年10月查核案件(1)

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元) 決標預算	預定進度	監造單位	承攬廠商	監造 扣點	評分	受查單 位參與
	馬 北郎 7 十岡口 J.		(千元)	實際進度					人員
	雲林縣斗南國民小學辦理「教育部國		57,025	16.14%					
1	民及學前教育署補助雲林縣政府新建公共化幼兒園園舍 ₁ 工程	雲林縣斗南鎮 斗南國民小學	57,025	23.24%		久木營造 有限公司		82	王俊孝
2	高級中等以下學校 運動操場及周邊設 施整建計畫	雲林縣立石榴國民中學	11,936	35.98%	呂罡銘建築 師事務所	久木營造 有限公司		81	林俊賢
2			11,930	46.73%				01	你没具
3	111年度東和國小	雲林縣古坑鄉	6,495	100.00%	大匠工程顧 問有限公司	長隆土木 包工業(雲		81	では、シンが出
3	南棟教室補強工程	東和國民小學	6,428	100.00%		林縣)		01	陳沼輝
1	111年度整建計畫- 雲林縣莿桐國小操 場跑道整建工程	小操	6,372	100.00%	楊文慶建築 師事務所	振典實業有限公司		81	李美憙
			6,372	100.00%				OT	子大忌



111年10月查核案件(2)

序	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	□ 監造單位 🦻	承攬廠商		監造	評分	受查單 位參與
號	工/注7日/ 117	<u> </u>	決標預算 (千元)	實際進度	血但丰田	牙()見側()口	扣點	扣點	BT /J	人員
5	雲林縣立東明國民 中學運動操場及周	雲林縣立 東明國民中學	8,529	73.73%	張益霖建築	振典實業 有限公司			81	陳育民
	邊設施整建計畫工 程		8,529	71.68%	師事務所				01	然 月以
6	古坑鄉149縣道 35K+700道路災害	雲林縣政府 工務處養護工	21,441	76.00%	新光工程顧	冠瑛營造			81	葉夏伯
	修復工程	程科	21,370	77.00%	問有限公司	有限公司			0 -	>r \ \
	雲林縣林內鄉九芎	=== ///\ 2.4\	40,841	88.79%	弈寬建築師	大地營造 股份有限			80	張維崢
	示範公墓第二納骨 塔新建工程	林內鄉公所	40,500	89.06%	事務所	公司			80	70000000000000000000000000000000000000
8	台西鄉南清橋拓寬	雲林縣政府	9,018	55.28%	地城工程技	赫誠營造			80	葉家誠
Ŏ	工程	工務處交通建 設科 	8,580	74.75%	術顧問有限 公司	有限公司			6U	未多祕



111年10月查核案件(3)

序	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	→ 監造單位 🥫	承攬廠商	廠商	監造	評分	受查單 位參與
號	工性句悟 	土辧早山	決標預算 (千元)	實際進度	益2年112	序原顺向	扣點	扣點	計力	山多 <u>與</u> 人員
9	台西鄉北極殿綠美	雲林縣政府 城鄉發展處城	15,647	71.81%	永澍景觀股	庫柏營造 有限公司			80	劉以興
9	化工程	郷工程科	14,530	73.89%	份有限公司				80	立几人头
	雲林縣古坑鄉華南 村坑頭幹線道路路	雲林縣政府 水利處水土保	11,398	0.75%	兆豐工程技 術顧問股份	春吉營造			80	吳文能
	基掏空災後復建工 程	持科	11,300	6.58%	有限公司	有限公司			80	犬
11	高鐵綠園道環境改	雲林縣政府	26,316	65.63%	橙谷景觀規	傑虹營造			00	扇心玄
11	善工程	工務處公共工 程科 	22,020	71.45%	劃設計有限 公司	有限公司			80	廖政彦
	雲林縣斗六市梅南 路、榮譽路及仁義		59,678	77.25%	柏和土木結	冠貹營造				
12	路四巷人行環境改善計畫暨市區道路品質改善工程一、 二期(第二期)		47,130	79.45%	構技師事務所	股份有限 公司			80	傅騰標



111年10月查核案件(4)

序	工程名稱	主	登包預算 (千元) 主辦單位 (千元) 監造單位	承攬廠商	廠商	監造	評分	受查單 位參與		
號	工/注·14/1 1/1	工册半四	決標預算 (千元)	實際進度		牙竹見側(10)	扣點	扣點	中ナノノ	人員
	 雲林縣文昌國小 111年度運動操場	雲林縣西螺鎮	11,576	70.94%	 唯新工程規 劃設計有限	祥賀營造	3	3	78	廖妙英
	及周邊設施整建工 程	文昌國民小學	11,576	73.38%	公司	有限公司	3	3	76	多处天
14	「雲林縣西螺鎮中山國民小學運動操	雲林縣西螺鎮	6,000	24.38%	築盟建築師 - ************************************	宜謙營造 工程有限			78	廖育辰
	場及周邊設施整建 ₋ 工程採購	中山國民小學	5,750	26.25%	事務所	公司				,,,,,,,
16	斗六市梅林里社區 文教/活動)中心中	=== ///\ 2.4\	6,137	78.79%	楊博閔建築	大舍設計 裝潢工程			78	傅騰標
	文教(活動)中心中 央廚房整建工程	斗六市公所	6,002	69.76%	師事務所	行			78	1号1馬1末
16	斗南鎮大東國小及 港墘路周邊人行環 境建置計畫	路周邊人行環 吴南镇公丘	37,211	54.64%	集得思工程 顧問有限公 司	毅和營造	3	3	77	並 寿電
			36,280	54.95%		有限公司	3	3		曾春渾

111年度9月份查核成績統計

9月份查核共8件,成績評定甲等共5件,比例63%

	查核件數	甲等	乙等	備註
本府暨所屬機關	1	1	0	水利處→甲1
鄉鎮市公所	3	3	1	台西鄉公所→甲1 斗六市公所→甲2 麥寮鄉公所→乙1
學校	3	1	2	文安國小→甲1 九芎國小→乙1 越港國小→乙1

111年度10月份查核成績統計

10月份查核共16件,成績評定甲等共12件,比例75%

	查核件數	甲等	乙等	備註
本府暨所屬機關	5	5	0	工務處→甲3 水利處→甲1 城鄉發展處→甲1
鄉鎮市公所	4	2	2	林內鄉公所→甲1 斗六市公所→甲1乙1 斗南鎮公所→乙1
學校	7	5	2	石榴國中→甲東明國中→甲斗南國小→甲東和國小→甲東和國小→甲 東和國小→甲中山國小→乙 文昌國小→乙



主辦單位常見缺失

	期間:自111年9月1日至111年10月31日 總件數 24件							
項次	缺失編號	缺失內容	精進作為					
1	4.01.06	監造計畫未確實審查。	請確實依各章節審查表審查,必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。					
2	4.01.13	標案管理系統未確實填報	本府工程施工查核小組網站提供標案 管理系統填報說明,亦提供系統填報 諮詢服務					
3	4.01.04	督導紀錄內容未詳實。	建議由具工程實務經驗之同仁協助督導,或聘請專家學者協助辦理督導,以增加督導紀錄之詳實性,另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點,請各單位確實據以執行。					
4	4.01.01	未編列二、三級品管材料檢試驗 費用。	請確實依公共工程施工品質管理制度 落實二層級品質管理制度之施工品質 查證。					



監造單位常見缺失

期間:自111年9月1日至111年10月31日 總件數 24件 精進作為 項次 缺失編號 缺失內容 施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單 辦理,並確實將抽查結果量化,再判讀是否 未落實抽查施工作業及抽驗材料設備 4.02.03.04 合格;材料設備檢試驗管制總表請確實依雲 及管控材料設備檢(試)驗管制總表。 林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要 點規定,詳列需檢驗項目及數量,確實執行 部分材料/設備及施工之抽查標準未符合監造單位確實審查廠商之品質計畫及施工計 4 02 01 05 需求。 書,確實依監告計畫編寫。 本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定 未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生 權責分工表,相關工地安全衛生、交通維持 4 02 03 05 交诵維持及環境保護等工作。 及環境保護工作監造單位若不落實抽查,可 依前揭規定予以扣罰。 請確實於監告計畫內之訂定抽查驗表單辦理 並確實將抽查標準值量化;材料設備檢試驗 未訂定抽查施工作業及抽驗材料設備 4.02.01.10 管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點 及管控材料設備檢(試)驗管制總表。 項目抽查檢驗作業要點規定,詳列需檢驗項 目及數量 請各單位確實依雲林縣政府公共工程契約約 監造報表未落實登載。 4.02.03.08 定權責分工表辦理,要求監造單位據以執行



承攬廠商常見缺失

期間:自111年9月1日至111年10月31日 總件數 24件

	۱۲۸۷		
項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行。	落實主辦機關督導及監造單位抽查,要 求廠商確實執行。
2	4.03.03	施工日誌未落實填報。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契 約約定權責分工表辦理,要求廠商據以 執行。
3	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標 準	確實依造工程會頒佈之監造計畫暨品質 計畫製作綱要訂定分項工程品質管理標 準
4	4.03.11.06	專任工程人員未落實填具督察 紀錄表。	請各單位確實依雲林縣政府公共工程契 約約定權責分工表辦理,要求廠商據以 執行。
4	4.03.14.03	執行安全衛生教育訓練。	請機關與監造單位確實督促廠商職安衛教育訓練時數應符合6小時規定,並留有相關紀錄及照片,例如:課程表、參訓人員簽名單、講師姓名等。



施工品質常見缺失

期間:自111年9月1日至111年10月31日 總件數 24件 缺失編號 缺失內容 精進作為 項次 預定完工日期、補助單位經費來源、政 風單位電話及QR CODE等欄位,請機關 5.09.08 工程告示牌內容未符合規定。 與監造單位確實督促廠商。 請機關與監造單位確實督促廠商依品質 5.07.01.14 測量及放樣不落實。 管理作業標準執行放樣工程。 混凝土澆置後於表面浮水消失後即速進 混凝土養護不合規範,塑性收縮行養護,覆蓋材料應直接鋪蓋於混凝土 5 01 02 表面上,並隨時保持濕潤,且不得少於 7 造成裂縫。 天 混凝土澆置前須規劃好時程,避免冷縫 混凝土澆置、搗實不合規範,有 5.01.01 產生,澆置後請確實做好震動搗實工作, 冷縫、蜂窩或孔洞產生。 避免產牛蜂窩、孔洞。 請機關與監造單位確實督促廠商依圖說 5.07.02.11 路基或瀝青混凝十厚度不足 施做確保路基或瀝青混凝十厚度達契約 要求。



施工品質常見缺失照片(1)

5.09.08

工程告示牌內容未符合規定。



梅南橋頭設置之工程告示牌太低,另承商之專任工程人員及品 品管人員無手機聯絡電話



施工品質常見缺失照片(2)

5.07.01.14 測量及放樣不落實。




測量放樣不落實無紀錄之留存,且造成多處路燈 基座、鋪面與排水管不符之情形。



施工品質常見缺失照片(3)

5.01.02

混凝土養護不合規範,塑性收縮造成裂縫

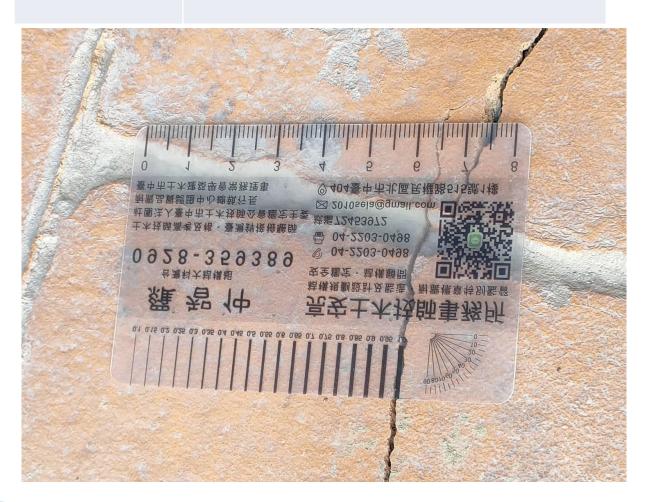

混凝土鋪面多處出現寬大裂縫過 ————多異常現象。



施工品質常見缺失照片(4)

5.07.02.11

路基或瀝青混凝土厚度不足



人行道鋪碎石料厚度不足。



施工品質常見缺失照片(4)

5.07.02.11 路基或瀝青混凝土厚度不足



PU跑道彈性基礎層平坦度不佳, 回填材料不符合規定。



標案管理系統未結案件

目前尚有185件工程自111年5月總累計實際完成進度即顯示為100%,該進度資訊卻於系統內連續登載達數月之久而未能結案,若案件已完成付款,請儘速辦理結案程序。

	未結案件數
本府暨所屬機關	85
鄉鎮市公所	65
學校	35



標案管理系統改版注意事項

- 一、新系統帳號及email資料確認:請於11月7日(一)至12月9日(五)於現有系統登入後, 完成新系統帳號及Email資料確認。
- 二、新系統帳號開通:工程會將依使用者填報之Email寄送新帳號開通通知(將於12月 14日凌晨寄送)。
- 三、新系統帳號授權:本系統將自動配發新帳號及權限給現有系統使用者(在2年內有登 入現有系統紀錄之使用者)。
- 四、開放各機關於12月16日至12月25日至新系統自由參與測試及體驗。
- 五、意見回饋:新系統功能測試期間若有任何建議,請將意見填報於工程會所提供之問題反映系統。
- 六、上線前配合事項:現有系統將於上線前5日(預定為111年12月26日)停止資料異動 (新增、刪除及修改),但仍提供查詢服務,屆時將於現有系統 公告,請各機關預為準備。
- 七、試辦期間詢問窗口(02)8789-7015、8789-7016、8789-7741,相關資訊以系統公告為準。



結 語

111年9-10月共查核24件,成績評定甲等共17件,比例 71%,其中:

- ▶ 本府查核6件 甲等6件 比例為100%
- ▶ 公所查核8件 甲等5件 比例為63%
- ▶ 學校查核10件 甲等6件 比例為60%
- 1) 甲等比例略為降低,希望各單位能繼續努力,確保工程 如質如期進行。
- 2) 標案管理系統未結案件數偏多,請各單位盡快辦理結案 程序。
- 3) 標案管理系統即將改版,請確認帳號及E-mail正確性。
