

雲林縣採購中心

工程施工查核 執行情形簡報

報告人：謝旻洲

中華民國 109 年 08 月 26 日

109年6月查核案件(1)

➤ 6月份總計查核10件，甲等7件，乙等3件，甲等比例70%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	縣道149甲線 25K+750~26K+600路 段修復及改善工程	本府工務處	133,516	24.24%	威勝工程顧 問有限公司	鴻捷營造 有限公司	0	0	85	廖政彥 副處長
			131,480	33.97%						
2	雲林縣西螺鎮福田 里徒步路網建置及 市容改善計畫	本府工務處	20,450	44.4%	鼎晟工程顧 問有限公司	漢鼎營造 有限公司	0	0	83	廖珉鋒 科長
			18,380	53.34%						
3	雲林溪掀蓋段污水 截流	本府水利處	311,220	51.65%	聯聖工程顧 問股份有限 公司	高輝營造 工程股份 有限公司	0	0	82	吳文能 副處長
			292,581	54.25%						
4	客子厝大排(第一期) 治理工程	本府水利處	89,893	28.36%	兆豐工程技 術顧問股份 有限公司	高蓋營造 有限公司	0	0	81	吳文能 副處長 2
			74,550	40.76%						

109年6月查核案件(2)


➤ 6月份總計查核10件，甲等7件，乙等3件，甲等比例70%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	108年雲林縣衛生局 辦公廳舍整修工程	雲林縣衛生局	4,337	100%	弈寬建築師 事務所	塔里星室 內裝修工 程有限公 司	0	0	80	楊育豪 科長
			3,725	100%						
6	水林鄉牛挑灣1號橋 旁復建工程等三件	水林鄉公所	12,794	64.69%	崇峻工程顧 問有限公司	嘉銘營造 有限公司	0	0	80	鍾學淵 課長
			12,530	74.84%						
7	雲林縣四湖鄉飛沙、 內湖及蔡厝村社區 生活環境建置計畫	四湖鄉公所	26,329	92.09%	總太工程顧 問有限公司	柏樺營造 有限公司	0	0	80	吳長和 課長
			25,670	100%						
8	褒忠鄉公所行政大 樓外牆整建工程	褒忠鄉公所	3,731	44.98%	和也建築師 事務所	善博營造 有限公司	0	0	79	丁康弘 課長
			3,500	39.99%						

109年6月查核案件(3)

➤ 6月份總計查核10件，甲等7件，乙等3件，甲等比例70%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
9	雲林縣金水164創新 城鄉特色產業場域 推動計畫－場域建 置工程	本府建設處	24,231	81.42%	點建築聯合 建築師事務 所	太鴻營造 有限公司	0	0	78	張勝欽 科長
			20,000	76.43%						
10	麥寮鄉施厝西施聯 合活動中心增建工 程	麥寮鄉公所	19,242	79.28%	黃憲國建築 師事務所	凱登營造 工程股份 有限公司	3	3	77	徐正杰 課長
			18,840	74.79%						

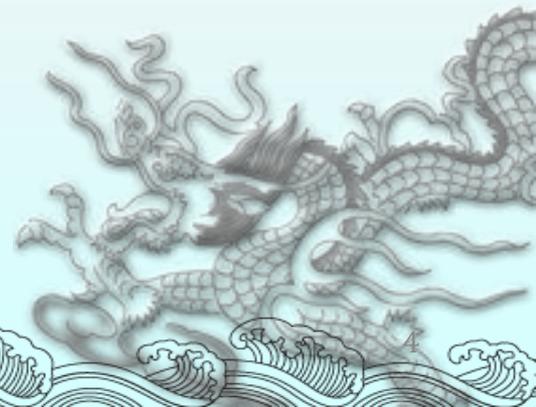

109年07月查核案件(1)

➤ 7月份總計查核12件，甲等8件、乙等4件，甲等比例66.67%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
1	滴仔2號滯洪池兼抽水站前池新建工程 含滴仔排水(虎尾區出口段)治理工程	本府水利處	73,994	46.68%	源隆技術顧問有限公司	天佑營造有限公司	0	0	81	吳文能 副處長
			69,568	52.84%						
2	雲林縣斗南鎮小東市地重劃工程	本府地政處	626,369	32.99%	台聯工程顧問股份有限公司	森榮營造有限公司	2	2	81	黃凱達 處長
			496,000	33.51%						
3	虎尾周邊街道系統整合串接改善計畫 第一期工程	本府工務處	24,804	70.17%	橙谷景觀規劃設計有限公司	悅騰營造有限公司	0	0	81	廖政彥 副處長
			22,300	70.29%						
4	永光國小108年度操場整建工程	永光國小	3,038	35.09%	呂罡銘建築師事務所	宏信土木包工業	0	0	80	吳國誠 校長
			3,027	35.87%						

109年07月查核案件(2)

➤ 7月份總計查核12件，甲等8件、乙等4件，甲等比例66.67%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
5	雲林縣大埤鄉酸鹹香大道改善計畫	大埤鄉公所	23,295	84.55%	弘強工程顧問企業有限公司	名谷營造有限公司	0	0	80	鄭任量 技士
			19,870	95.61%						
6	雲林縣北港舊登記所修復再利用工程	本府文化觀光處	14,259	19.98%	經緯地景建築師事務所	益安營造有限公司	0	0	80	張力元 科長
			13,450	20.07%						
7	雲林縣崙背鄉市區道路品質暨人行道環境建置計畫工程	崙背鄉公所	59,259	68.30%	信創工程顧問有限公司	宗原營造有限公司	3	3	80	葉書銘 課長
			56,200	61.12%						
8	斗六市老人文康活動中心耐震補強工程	斗六市公所	8,473	79.64%	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司	4	4	80	傅騰標 技正
			7,600	73.11%						

109年07月查核案件(3)

➤ 7月份總計查核12件，甲等8件、乙等4件，甲等比例66.67%。

序號	工程名稱	主辦單位	發包預算 (千元)	預定進度	監造單位	承攬廠商	廠商 扣點	監造 扣點	評分	受查單 位參與 人員
			決標預算 (千元)	實際進度						
9	斗南鎮停四停車場改善工程	本府工務處	6,593	37.00%	安吉工程顧問有限公司	建升營造有限公司	1	1	78	李重賢 科長
			5,400	40.38%						
10	土庫鎮通學步道及共同管溝建設工程	土庫鎮公所	45,180	52.56%	旺揚工程顧問有限公司	萬長榮營造有限公司	7	7	77	吳晶綉 課長
			30,405	65.73%						
11	雲林縣臺西鄉海埔新生地海園中排改善工程(第一期)(複查)	本府水利處	76,990	84.68%	巨廷工程顧問股份有限公司	築展營造股份有限公司	4	4	77	林昆賢 技正
			70,600	88.17%						
12	褒忠鄉新湖村集會所興建工程	褒忠鄉公所	19,008	29.45%	廖明隆建築師事務所	祥凱營造有限公司	8	8	74	丁康弘 課長
			18,987	29.53%						



查核成績統計

109年6月份查核共10件，成績評定甲等共**7**件，比例達**70%**

	查核件數	甲等	乙等	甲等比例
本府暨所屬機關	6	5	1	本府工務處-甲2 本府水利處-甲2 雲林縣衛生局-甲1 本府建設處-乙1
公所	4	2	2	水林鄉公所-甲1 四湖鄉公所-甲1 麥寮鄉公所-乙1



查核成績統計

109年7月份查核共12件，成績評定甲等共**8**件，比例達**66.67%**

	查核件數	甲等	乙等	甲等比例
本府暨所屬機關	6	4	2	本府水利處-甲1乙1 本府工務處-甲1乙1 本府地政處-甲1 本府文化觀光處-甲1
公所	5	3	2	大埤鄉公所-甲1 崙背鄉公所-甲1 斗六市公所-甲1 褒忠鄉公所-乙1 土庫鎮公所-乙1
學校	1	1	0	永光國小-甲1

主辦單位常見缺失

期間：自109年07月01日至109年07月31日

總件數 22件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.01.06	監造計畫未確實審查。	請確實依各章節審查表審查，必要時得聘請專業之外聘委員協助審查。
2	4.01.04	督導紀錄內容未詳實。	建議由具工程實務經驗之同仁協助督導，或聘請專家學者協助辦理督導，以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦有訂定雲林縣政府工程督導小組作業要點，請各單位確實據以執行。
3	4.01.13	標案管理系統資料填報不完整。	標案管理系統中，有關保險單號碼、各種計畫核定文號、相關人員證書編號等，請確實依相關規定確實填列。
4	4.01.09	主辦單位應定期或不定期與監造單位及施工單位召開進度檢討會以了解掌控工程進度與品質。	定期召開進度檢討會議，以確實掌控工程進度與品質，請各單位確實據以執行。

監造單位常見缺失

期間：自109年07月01日至109年07月31日

總件數 22件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.02.03.04	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落實管控材料設備檢(試)驗管制總表。	施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗表單辦理，並確實將抽查結果量化，再判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總表請確實依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗項目及數量，確實執行。
2	4.02.01.05	部份材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。	監造單位應依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點第九點第二款辦理，製作監造計畫應併同預算書圖一併送審。
3	4.02.03.08	監造報表未落實填報。	本府訂有雲林縣政府及所屬(轄)機關學校公共工程(建築物)施工日誌及監造報表填報注意事項，請各單位確實依上揭規定，要求監造單位據以執行。
4	4.02.03.05	未落實抽查施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。	本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約約定權責分工表，相關工地安全衛生、交通維持及環境保護工作監造單位若不落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。
5	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法未符合需求。	監造單位應依雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點第九點第二款辦理，確實審查廠商之品質計畫及施工計畫。

承攬廠商常見缺失

期間：自109年07月01日至109年07月31日

總件數 22件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行。	落實主辦機關督導及監造單位抽查，要求廠商確實執行。
2	4.03.05	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表未符合工程需求。	於審查施工計畫時，聘請具工程實務經驗之專家學者協助審查，以符合工程需要。
3	4.03.14.03	未訂定各分項工程品質管理標準。	於審查品質計畫時，聘請具工程實務經驗之專家學者協助審查，以符合工程需要。
4	4.03.11.06	未落實執行安全衛生教育訓練。	勞工應施以從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練，以增進勞工安全衛生知能，降低職業災害。
5	4.03.03	施工日誌未落實填報。	本府訂有雲林縣政府及所屬(轄)機關學校公共工程(建築物)施工日誌及監造報表填報注意事項，請各單位確實依上揭規定，要求廠商據以執行。

施工品質常見缺失

期間：自109年07月01日至109年07月31日

總件數 22件

項次	缺失編號	缺失內容	精進作為
1	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	混凝土澆置前須規劃好時程，避免冷縫產生，澆置後請確實做好震動搗實工作，避免產生蜂窩、孔洞。
2	5.16.01	未落實執行汛期工地防災自主檢查表	廠商每月至少填報1次汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查，颱風豪雨來時廠商每月至少填報1次汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查則應增加自主檢查頻率。
3	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	於混凝土模板拆模後，確實將鐵絲、鐵件及模板等拆除。
4	5.09.08	工程告示牌內容未符合規定。	預定完工日期、補助單位經費來源、政風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與監造單位確實督促廠商確實辦理。
5	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	廠商應確實依核定之交通安全維持計畫，佈設相關交維設施，請機關與監造單位確實督促廠商確實辦理。

結 語

109年1-7月共查核58件，成績評定甲等共41件，比例高達**70.69%**，其中：

- 本府查核28件 甲等23件 比例為**82.14%**
- 公所查核24件 甲等13件 比例為**54.16%**
- 學校查核6件 甲等5件 比例為**83.33%**

截至目前為止甲等比例為70.69，希望各單位能繼續努力，保持優良成績。此外本府訂於本(109)年11月17(星期二)辦理公共工程品質管理研習會(二)，邀請營建署南區工程處林副處長瑞德講授工程履約管理(變更設計、竣工、結算及驗收與決算作業)(6hr)，歡迎各單位踴躍參加。

簡報完畢
敬請指教

