

Dsic



雲林縣政府

YUNLIN COUNTY GOVERNMENT

所屬機關學校共構版 公文線上簽核系統建置案

111年04月 定期會議

專案經理 李盈德(Peter)

2022.04.25



帝緯系統整合股份有限公司
Digitware System Integration Corporation



前次會議待辦事項

- 莉桐代表會建議系統延長登出時間=>依據機關ISMS規定不予延長
- 斗六市公所建議提供裁處書範本=>會後已提供
- 因為主管也有承辦公文，建議提供如同承辦人首頁的可查詢項目=>會後已提供
- 公布欄權限控管不應可隨意公布其他人公文=>會後已修正
- 111/04/21-22本府及警察局更版

[illegible]



本期工作進度說明

項次↵	工作產品↵	預計交付日期↵	狀態↵	實際交付日期↵	備註↵
1↵	專案工作計畫書↵	2021/10/21↵	已完成↵	2021/10/20↵	↵
2↵	硬體設備共 16 項↵	2021/12/15↵	已完成 15 項↵	2021/11/16↵	變更契約完成↵
3↵	系統建置報告書↵	2021/12/15↵	已完成↵	2021/12/13↵	↵
4↵	系統功能架構、程式說明文件↵	2021/12/15↵	已完成↵	2021/12/13↵	↵
5↵	程式執行碼電子檔↵	2021/12/15↵	已完成↵	2021/12/13↵	↵
6↵	期中報告書↵	2021/12/15↵	已完成↵	2021/12/13↵	↵
7↵	轉檔完工報告書↵	2022/04/30↵	製作中↵	↵	↵
8↵	教育訓練完工報告書↵	2022/04/30↵	製作中↵	↵	↵
9↵	人員駐點上線完工報告書↵	2022/04/30↵	製作中↵	↵	↵
10↵	期末報告書↵	2022/04/30↵	製作中↵	↵	↵

項次↵	項目↵	實際↵	說明↵
1↵	專案工作計畫書↵	2021/11/3 完成審查↵	↵
2↵	專案第一期驗收↵	2021/11/18 完成驗收↵	↵
3↵	專案狀態報告書_11010↵	2021/11/30 完成審查↵	↵
4↵	專案狀態報告書_11011↵	2021/12/21 完成審查↵	↵
5↵	專案狀態報告書_11012↵	2022/01/14 完成審查↵	↵
6↵	專案狀態報告書_11101↵	2022/02/16 完成審查↵	↵
7↵	專案狀態報告書_11102↵	2022/03/11 完成審查↵	↵
8↵	專案狀態報告書_11103↵	2022/04/07 交付↵	預定 2022/04/25 月會↵


項次	項目	實際	說明
1.	全案進度 (%)	85%	專案啟動 100% 系統需求 90% 系統開發 90% 系統建置 90% 系統測試 90% 教育訓練 40% 輔導上線 50% 驗收 80%
2.	工期進度 (Day %)	70.0%	累計工期:145/全案工期:207(最遲 2022/4/30 計算)
3.	全案累計交付項目數	6	專案工作計畫書、硬體設備共 15 項、系統建置報告、系統功能架構及程式說明文件、程式執行碼電子檔、期中報告書

項次	項目	實際	說明
1.	全案進度 (%)	90%	專案啟動 100% 系統需求 98% 系統開發 97% 系統建置 98% 系統測試 97% 教育訓練 100% 輔導上線 100% 驗收 80%
2.	工期進度 (Day %)	85.5%	累計工期:177/全案工期:207(最遲 2022/4/30 計算)
3.	全案累計交付項目數	6	專案工作計畫書、硬體設備共 15 項、系統建置報告、系統功能架構及程式說明文件、程式執行碼電子檔、期中報告書

工作項目	上月進度	本月累計進度	進度說明	負責成員
專案啟動會議	100%	100%	10/14 召開專案啟動會議	李盈德
專案工作計畫書	100%	100%	10/20 交付專案工作計畫書 11/3 完成審查	李盈德
衛生局系統訪談	100%	100%	10/14-15 完成系統訪談	李盈德
需求分析	90%	90%	1. 10/21 交付衛生局需求訪談會議紀錄 2. 需求分析 3. 衛生局 11/16 召開討論會議，11/19 交付會議紀錄 4. 衛生局及基層機關資料庫分析	李盈德 林昆霈
系統開發、程式修改	90%	94%	1. 配合新的文書規範調整系統 2. 衛生局需求調整系統 3. 系統元件及功能測試 4. 配合教育訓練及第二梯上線機關調整部分功能	林昆霈等開發人員
硬體交付與安裝	95%	100%	10/7 下單委外供應商 11/2 貨物到機房 11/16 開始主機安裝 12/2 完成主機硬體安裝	李盈德
系統安裝與測試	90%	100%	11/19-24 系統安裝設定 11/29-12/10 系統測試、弱點掃描	李盈德 客服工程師
系統測試個案撰寫及安排種子人員	90%	100%	12/10 交付系統測試個案 12/22-23 種子測試 測試資料彙整完畢，無重大需調整事項	李盈德 客服工程師

第二期文件撰寫	100%	100%	12/13 交付系統建置報告書、系統功能架構、程式說明文件，程式執行碼電子檔，期中報告書	李盈德 林昆霈等開發人員
教育訓練時間安排	100%	100%	12/30 完成教育訓練規劃	李盈德 林昆霈等開發人員
教育訓練	100%	100%	1/05 提供教育訓練教材電子檔 1/10 開始教育訓練 3/10 完成所有教育訓練	林雅芳等 客服人員
系統上線	95%	100%	1/24 第一梯次 36 個機關 2 月份上線完成 40 個機關 3/21 完成所有機關上線	李盈德 及客服人員

■ 以03月04、07、08日為例

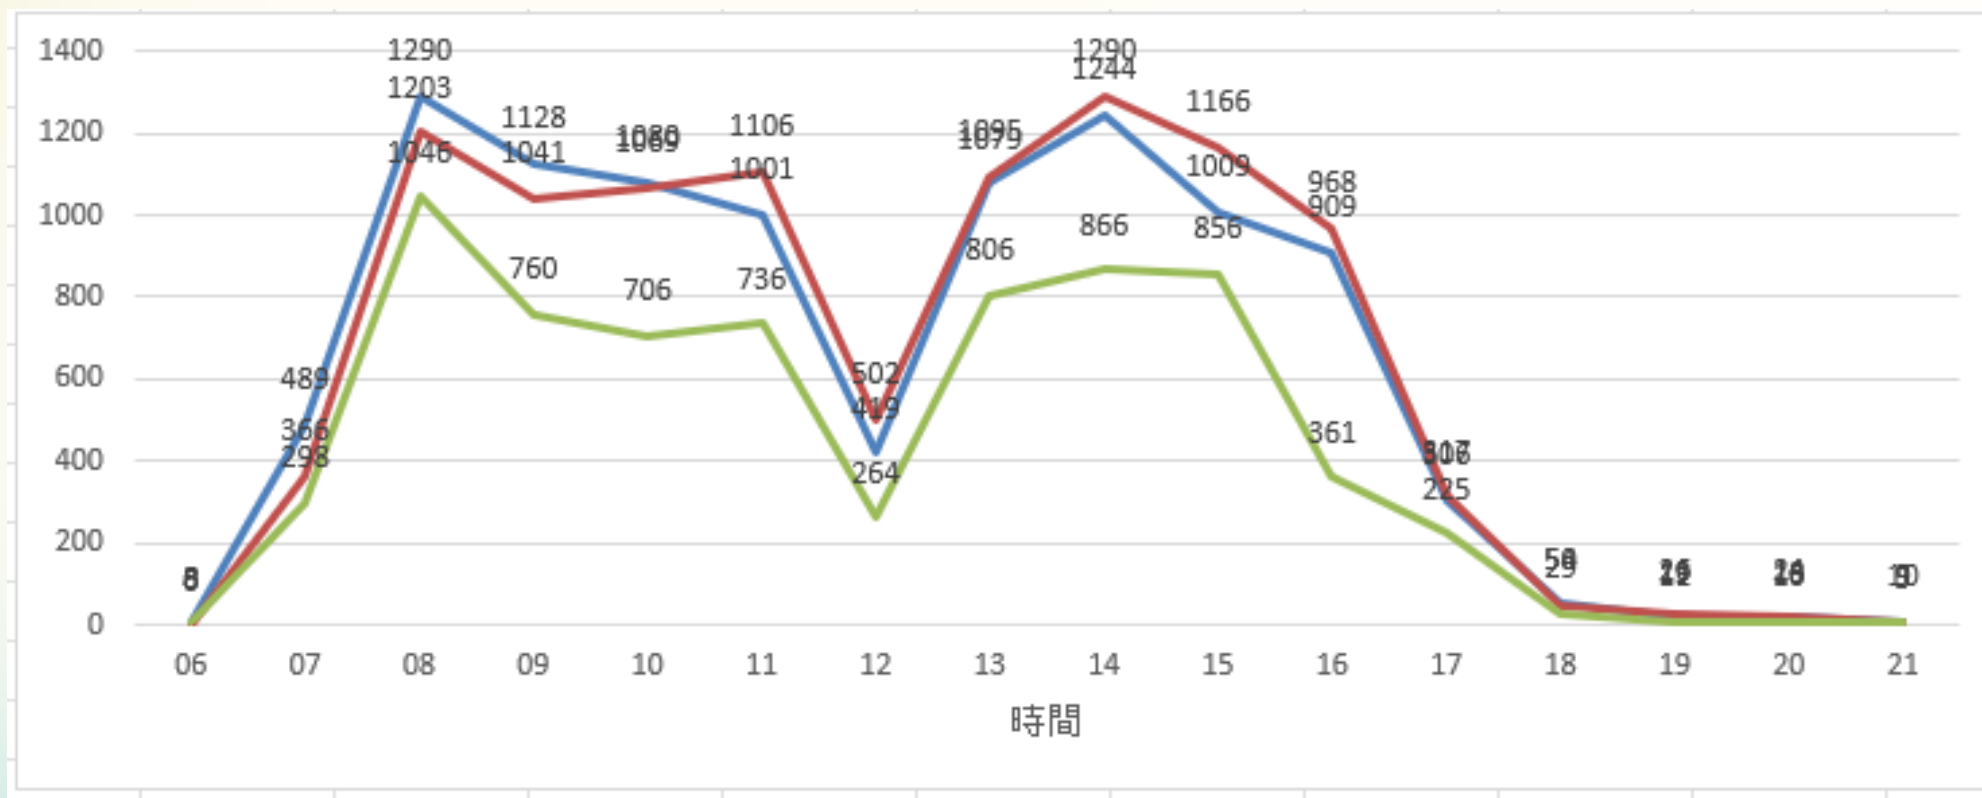


■ 資料庫

1.雲端機關資料庫已於03/17移轉

待辦公文

2.衛生局處理中，預計03/27移轉

MySQL->SQL Server 型態，資料面

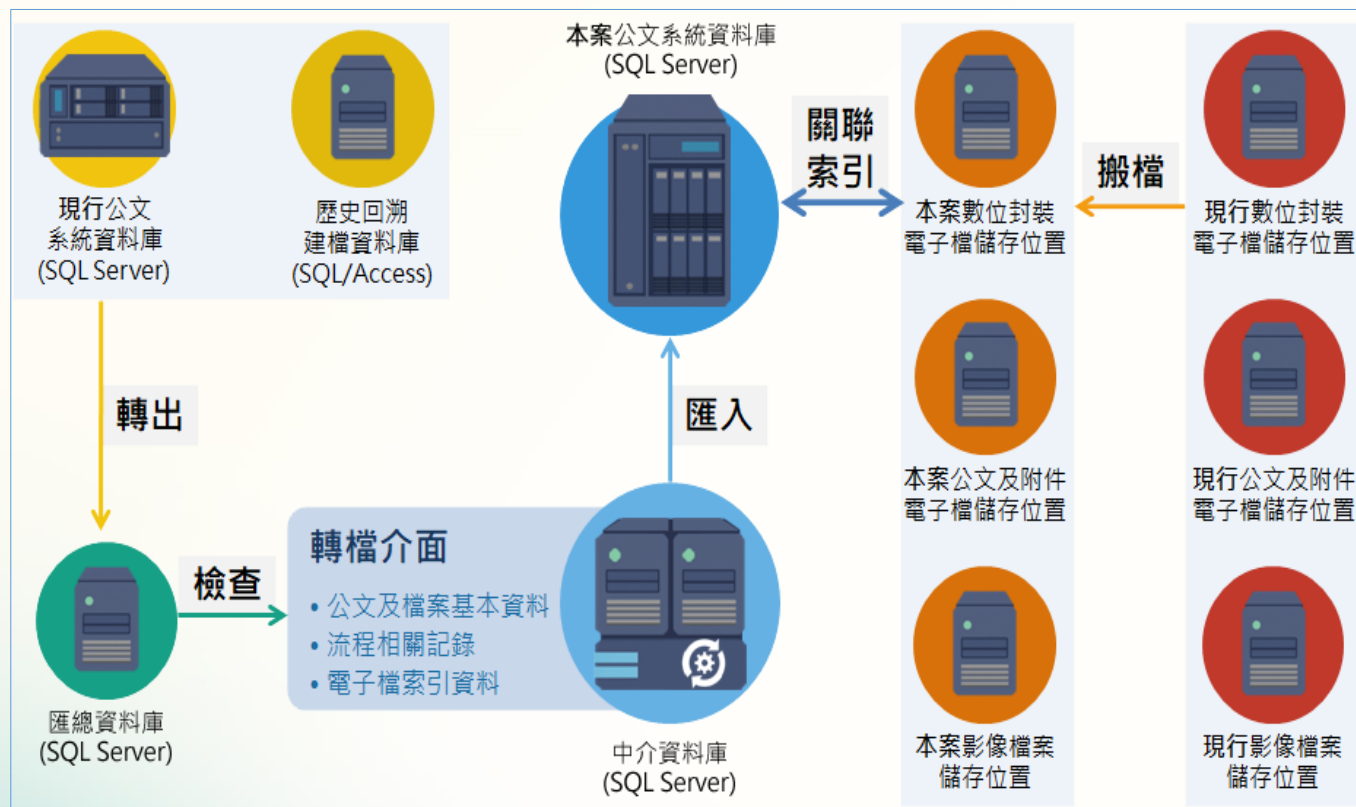



系統轉檔狀況(二)

■ 雲端數量

主要項目	數量
DocHeader	22,982,912
FlowDetail	107,397,699
FepHeader	8,849,333
FepAtaDetail	18,499,473
公文製作檔案	80,000,000以上

■ 衛生局數量

主要項目	數量
DocHeader	922,463
FlowDetail	1,976,594
FepHeader	195,707
FepAtaDetail	待完成
公文製作檔案	待完成



下期工作進度說明

項次	待辦事項	處理說明	狀態	處理人員
1.	硬體到貨 及 安裝	完成安裝及測試 完成備份設定	☐ 未結案； ☒ 已結案	李盈德
2.	審查專案工作計畫書	已完成	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如
3.	衛生局需求確認會議	已完成	☐ 未結案； ☒ 已結案	黃靖文
4.	需求分析	已完成	☐ 未結案； ☒ 已結案	李盈德 林昆霖
5.	系統開發	執行中，部分完成	☒ 未結案； ☐ 已結案	林昆霖...等
6.	系統安裝與測試	執行中，部分完成	☒ 未結案； ☐ 已結案	林雅芳...等
7.	系統測試個案調整 系統種子人員測試安排及測試	12/22-23 測試 測試資料彙整完畢，無重大需調整事項	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如 李盈德
8.	教育訓練時程規劃 教育訓練安排	完成教育訓練規劃 開放報名	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如 李盈德
9.	教育訓練	完成教育訓練	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如 林雅芳...等
10.	系統上線	1/24 第一梯次 36 個機關 2 月份上線完成 40 個機關 3/25 完成所有機 關上線	☐ 未結案； ☒ 已結案	0800 客服專線



議題討論



帝緯系統整合股份有限公司
Digitware System Integration Corporation
