

Dsic



雲林縣政府

YUNLIN COUNTY GOVERNMENT

所屬機關學校共構版 公文線上簽核系統建置案

111年02月 定期會議

專案經理 李盈德(Peter)

2022.02.16



帝緯系統整合股份有限公司
Digitware System Integration Corporation



前次會議待辦事項

前次會議待辦事項進度(一)

- 公文系統與AD整合，代表會機關除外，系統首頁及帳號管理的議題討論。
[目前進度] 1.代表會帳號已發放、2.新增東南及淵明兩所代用國中
- 機關反映無法登入或短時間被登出=>幼兒園獨立對外網段
西螺鎮公所對外4線對縣府、調整為1線。
- 戶所組織架構，雲端無拆分股別，新系統進行組織拆分調整





本期工作進度說明

項次	工作產品	預計交付日期	狀態	實際交付日期	備註
1	專案工作計畫書	2021/10/21	已完成	2021/10/20	
2	硬體設備共 16 項	2021/12/15	已完成 15 項	2021/11/16	剩餘變更契約中
3	系統建置報告書	2021/12/15	已完成	2021/12/13	
4	系統功能架構、程式說明文件	2021/12/15	已完成	2021/12/13	
5	程式執行碼電子檔	2021/12/15	已完成	2021/12/13	
6	期中報告書	2021/12/15	已完成	2021/12/13	
7	轉檔完工報告書	2022/04/30			
8	教育訓練完工報告書	2022/04/30			
9	人員駐點上線完工報告書	2022/04/30			
10	期末報告書	2022/04/30			

項次	項目	實際	說明
1	專案工作計畫書	2021/11/3 完成審查	
2	專案第一期驗收	2021/11/18 完成驗收	
3	專案狀態報告書_11010	2021/11/30 完成審查	
4	專案狀態報告書_11011	2021/12/21 完成審查	
5	專案狀態報告書_11012	2022/01/14 完成審查	
6	專案狀態報告書_11101		預定 2022/02/08 交付

項次	項目	實際	說明			
1.	全案進度 (%)	80%	專案啟動	100%	系統測試	90%
			系統需求	90%	教育訓練	40%
			系統開發	90%	輔導上線	14%
			系統建置	90%	驗收	80%
2.	工期進度 (Day %)	56.5%	累計工期:117/全案工期:207(最遲 2022/4/30 上線日計算)			
3.	全案累計交付項目數	6	專案工作計畫書、硬體設備共 15 項、系統建置報告、系統功能架構及程式說明文件、程式執行碼電子檔、期中報告書			

工作項目	上月進度	本月累計進度	進度說明	負責成員
專案啟動會議	100%	100%	10/14 召開專案啟動會議	李盈德
專案工作計畫書	100%	100%	10/20 交付專案工作計畫書 11/3 完成審查	李盈德
衛生局系統訪談	100%	100%	10/14-15 完成系統訪談	李盈德
需求分析	90%	90%	1. 10/21 交付衛生局需求訪談會議紀錄 2. 需求分析 3. 衛生局 11/16 召開討論會議, 11/19 交付會議紀錄 4. 衛生局及基層機關資料庫分析	李盈德 林昆霖
系統開發、程式修改	90%	92%	1. 配合新的文書規範調整系統 2. 衛生局需求調整系統 3. 系統元件及功能測試 4. 配合教育訓練及第一梯上線機關調整部分功能	林昆霖等開發人員
硬體交付與安裝	95%	100%	10/7 下單委外供應商 11/2 貨物到機房 11/16 開始主機安裝 12/2 完成主機硬體安裝	李盈德
系統安裝與測試	90%	100%	11/19-24 系統安裝設定 11/29-12/10 系統測試、弱點掃描	李盈德 客服工程師
系統測試個案撰寫及安排種子人員	90%	100%	12/10 交付系統測試個案 12/22-23 種子測試 測試資料彙整完畢, 無重大需調整事項	李盈德 客服工程師

第二期文件撰寫	100%	100%	12/13 交付系統建置報告書、系統功能架構、程式說明文件, 程式執行碼電子檔, 期中報告書	李盈德 林昆霖等開發人員
教育訓練時間安排	100%	100%	12/30 完成教育訓練規劃	李盈德 林昆霖等開發人員
教育訓練	0%	40%	1/05 提供教育訓練教材電子檔 1/10 開始教育訓練	林雅芳等 客服人員
系統上線	0%	14%	1/24 第一梯次 36 個機關	李盈德 及客服人員

- 建置入口網連結，及獨立帳密整合AD的網頁。代表會機關除外
- <https://yunlinedoc.yunlin.gov.tw/>



- 差勤整合已於02/10啟用，下圖以鎮南國小為例


雲林縣政府

雲林縣斗六市鎮南國民小學



輔導處 張東慈(承辦人員)


公文管理
承辦人作業
公文查詢
報表列印
公布欄管理
基本資料
系統管理


代理人設定

新增
111/02/10 ~ 111/03/12

序	承辦人	代理單位	代理群組	代理人	起始時間	結束時間
1	張東慈	輔導處	承辦人員	林巧茹	111/02/10 12:00:00	111/02/10 17:00:00

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

上一頁
1
下一頁

DSIC
Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

教育訓練時程

星期	一	二	三	四	五	
日期	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	
上午 9-12時	種子師資(收、發管人員) C-1	種子師資(檔管人員) C-2	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-1	種子師資(系統管理) E-1		所屬機構+衛生所(36)
下午 2-5時	種子師資(承辦人員、主管人員) D-1	種子師資(承辦人員、主管人員) D-2	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-2		X	所屬機構+衛生所(36)
日期	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	
上午 9-12時	種子師資(收、發人員) C-3	種子師資(檔管人員) C-4	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-3	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-5	種子師資(承辦人員、主管人員) D-5	公所+代表會(40)
下午 2-5時	種子師資(承辦人員、主管人員) D-3	種子師資(承辦人員、主管人員) D-4	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-4	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-6	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-7	公所+代表會(40)
日期	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	
上午 9-12時	種子師資(收、發人員) C-5	種子師資(檔管人員) C-6		X	X	公所+代表會(40)
下午 2-5時	種子師資(系統管理) E-2	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) (預留場次)		X	X	公所+代表會(40)
日期	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	
上午 9-12時	X	X	系統推廣說明會(收、發、檔管人員) A-1	系統推廣說明會(收、發、檔管人員) A-2	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-10	各級學校
下午 2-5時	X	X	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-8	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-9	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-11	各級學校
日期	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	
上午 9-12時	系統推廣說明會(收、發、檔管人員) A-3	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-13	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) (預留場次)	系統推廣說明會(系統管理) E-4		各級學校
下午 2-5時	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-12	系統推廣說明會(承辦人員、主管人員) B-14	系統推廣說明會(系統管理) E-3			各級學校

教育訓練時程

日期	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	
上午 9-12時					單位收發作業 (衛生局、消防局) 3-1	附屬機關(2)
下午 2-5時					承辦人作業 (衛生局) 5-1	
日期	2月28日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	
上午 9-12時	X	總發文作業 (衛生局、消防局) 2-1	主管簽核作業 (衛生局) 6-1	檔案管理作業 (衛生局、消防局) 7-1	主管簽核作業 (消防局) 6-2	附屬機關(2)
下午 2-5時	X	總收文作業 (衛生局、消防局) 1-1	承辦人作業 (消防局) 5-2	承辦人作業 (衛生局) 5-3	系統維護作業 8-1	附屬機關(2)
日期	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	
上午 9-12時	主管簽核作業 (衛生局、消防局) 6-3	承辦人作業 (衛生局、消防局) 5-5	主管一對一 (衛生局)	主管一對一 (消防局)		附屬機關(2)
下午 2-5時	承辦人作業 (消防局) 5-4	稽催研考作業 (衛生局、消防局) 4-1	主管一對一 (消防局)	主管一對一 (衛生局)		附屬機關(2)

	A	C	E	G	I	K	M	O	Q	S
1	附屬一、二級機關(6) 公所(20)		代表會(20)	衛生所(20)	戶政事務所(6)	地政事務所(6)	高級中學(3)	國民中(小)學(31)	國民小學(154)	
2	雲林縣衛生局 03/21上線	雲林縣斗六市公所 02/09	雲林縣斗六市民代表會 02/09	雲林縣斗六市衛生所	雲林縣斗六戶政事務所	雲林縣斗六地政事務所	雲林縣立麥寮高級中學	雲林縣立斗六國民中學	雲林縣斗六市鎮西國民小學	
3	雲林縣消防局 03/14上線	雲林縣斗南鎮公所 02/09	雲林縣斗南鎮民代表會 02/09	雲林縣斗南鎮衛生所	雲林縣斗南戶政事務所	雲林縣斗南地政事務所	雲林縣立斗南高級中學 雲林縣立古坑華德福實驗高級中學	雲林縣立雲林國民中學	雲林縣斗六市鎮東國民小學	
4	雲林縣採購中心 01/24	雲林縣虎尾鎮公所 02/09	雲林縣虎尾鎮民代表會 02/09	雲林縣虎尾鎮衛生所	雲林縣西螺戶政事務所	雲林縣虎尾地政事務所	雲林縣立其松藝術高級中等學校	雲林縣立荊桐國民中學	雲林縣斗六市清瀾國民小學	
5	雲林縣家庭教育中心 01/24	雲林縣西螺鎮公所 02/09	雲林縣西螺鎮民代表會 02/09	雲林縣西螺鎮衛生所	雲林縣虎尾戶政事務所	雲林縣西螺地政事務所		雲林縣立虎尾國民中學	雲林縣斗六市梅林國民小學	
6	雲林縣動植物防疫所 01/24	雲林縣土庫鎮公所 02/09	雲林縣土庫鎮民代表會 02/09	雲林縣土庫鎮衛生所	雲林縣北港戶政事務所	雲林縣北港地政事務所		雲林縣立土庫國民中學	雲林縣斗六市石榴國民小學	
7	雲林縣立體育場 01/24	雲林縣北港鎮公所 02/14	雲林縣北港鎮民代表會 02/14	雲林縣北港鎮衛生所	雲林縣麥寮戶政事務所	雲林縣臺西地政事務所	以上03/01上線	雲林縣立褒忠國民中學	雲林縣斗六市溪洲國民小學	
8		雲林縣古坑鄉公所 02/14	雲林縣古坑鄉民代表會 02/14	雲林縣古坑鄉衛生所				雲林縣立東勢國民中學	雲林縣斗六市保長國民小學	
9		雲林縣大埤鄉公所 02/14	雲林縣大埤鄉民代表會 02/14	雲林縣大埤鄉衛生所				雲林縣立西螺國民中學	雲林縣斗六市林頭國民小學	
10		雲林縣荊桐鄉公所 02/14	雲林縣荊桐鄉民代表會 02/14	雲林縣荊桐鄉衛生所				雲林縣立二崙國民中學	雲林縣斗六市鎮南國民小學	
11		雲林縣林內鄉公所 02/14	雲林縣林內鄉民代表會 02/14	雲林縣林內鄉衛生所				雲林縣立崙背國民中學	雲林縣斗六市公誠國民小學	
12		雲林縣二崙鄉公所 02/17	雲林縣二崙鄉民代表會 02/17	雲林縣二崙鄉衛生所				雲林縣立北港國民中學	雲林縣斗六市久安國民小學	
13		雲林縣崙背鄉公所 02/17	雲林縣崙背鄉民代表會 02/17	雲林縣崙背鄉衛生所				雲林縣立建國國民中學	雲林縣古坑鄉東和國民小學	
14		雲林縣麥寮鄉公所 02/17	雲林縣麥寮鄉民代表會 02/17	雲林縣麥寮鄉衛生所				雲林縣立元長國民中學	雲林縣古坑鄉永光國民小學	
15		雲林縣東勢鄉公所 02/17	雲林縣東勢鄉民代表會 02/17	雲林縣東勢鄉衛生所				雲林縣立四湖國民中學	雲林縣古坑鄉華山國民小學	
16		雲林縣褒忠鄉公所 02/17	雲林縣褒忠鄉民代表會 02/17	雲林縣褒忠鄉衛生所				雲林縣立口湖國民中學	雲林縣古坑鄉棋山國民小學	
17		雲林縣臺西鄉公所 02/22	雲林縣臺西鄉民代表會 02/22	雲林縣臺西鄉衛生所				雲林縣立水林國民中學	雲林縣古坑鄉桂林國民小學	
18		雲林縣元長鄉公所 02/22	雲林縣元長鄉民代表會 02/22	雲林縣元長鄉衛生所				雲林縣立臺西國民中學	雲林縣古坑鄉興昌國民小學	
19		雲林縣四湖鄉公所 02/22	雲林縣四湖鄉民代表會 02/22	雲林縣四湖鄉衛生所				雲林縣立崇德國民中學	雲林縣古坑鄉水碓國民小學 雲林縣古坑鄉古坑國民小學 (雲林縣立古坑國民中小學)	
20		雲林縣口湖鄉公所 02/22	雲林縣口湖鄉民代表會 02/22	雲林縣口湖鄉衛生所				雲林縣立東明國民中學		以上03/01上線
21		雲林縣水林鄉公所 02/22	雲林縣水林鄉民代表會 02/22	雲林縣水林鄉衛生所				雲林縣立大埤國民中學	雲林縣林內鄉林內國民小學	
22	edocapi3							雲林縣立飛沙國民中學	雲林縣林內鄉重興國民小學	
23				以上01/24上線	以上01/24上線	以上01/24上線		雲林縣立宜梧國民中學	雲林縣林內鄉九芎國民小學	
24		edocapi4	edocapi4	edocapi3	edocapi3	edocapi3	edocapi5	雲林縣立東和國民中學	雲林縣林內鄉成功國民小學	
25								雲林縣立馬光國民中學	雲林縣林內鄉林中國國民小學	



■ 01/24 所屬機關、戶所、地所、衛生所

上線機關數：36 (府外所屬機關、衛生所、戶所、地所)

狀況尚可，一早主要是交換站台府方沒有開放防火牆，以及基本資料的調整，還有FEPODI交換漏文問題，都已即時處理

一、(公文件數及主要處理問題類型說明)

電話通數：133通

系統紀錄件數：

總收文：532件(423件電子簽核，109件紙本簽核)

創文：77件(38件電子簽核，39件紙本簽核)

發文：19件(16件電子簽核，3件紙本簽核)

存查：65件(19件電子簽核，46件紙本簽核)

API電子交換收發文狀況：

收文：548件(成功：548件，失敗：0件)

發文：9件(重送總件數 0件，重送總次數0次)

另，查有

雲林縣古坑鄉衛生所李佳餘 於雲端公文系統掛收文號，明天0800客服通知勿再作業

雲林縣立體育場、雲林縣斗六地政事務所、雲林縣北港地政事務所 有創文，應是前文未了，屬容忍範圍內，再觀察

上線機關數：36 (府的附屬機關、衛生所、戶所、地所)

今天主要有範本需求問題、基本資料、衛生所檔號在雲端去年保存年限全錯，大概都可即時處理

一、(公文件數及主要處理問題類型說明)

電話通數：117通，比起昨天133通略降

系統紀錄件數：

總收文：406件(331件電子簽核，75件紙本簽核)

創文：80件(31件電子簽核，49件紙本簽核)

發文：54件(22件電子簽核，32件紙本簽核)

存查：161件(113件電子簽核，48件紙本簽核)

API電子交換收發文狀況

收文：299件(成功：299件，失敗：0件)

發文：33件(重送總件數 1件，重送總次數1次)

[須優先處理問題] (Bugs及 上線重大問題)

1.API電子交換查詢，件數統計有誤，已經處理。

[協調、需求或建議事項](協調機關資訊或文書窗口，決定相關事宜)

■ 02/09 公所、代表會

上線機關數：10 (5個公所 及 5個代表會)

一、(公文件數及主要處理問題類型說明)

電話通數：SRWEB 13通，各公所駐點人員各約30-40個問題諮詢，約200個

系統紀錄件數：

總收文：505件(327件電子收文，178件紙本收文)

創文：213件(61件電子簽核，152件紙本簽核)

發文：112件(14件電子簽核，27件紙本簽核)

存查：185件(41件電子簽核，9件紙本簽核)

API電子交換收發文狀況

收文：330件(成功：330，失敗：0件)

發文：21件(重送總件數 0件，重送總次數0次)

[須優先處理問題] (Bugs及 上線重大問題)

1.經查土庫代表會 跟斗南代表會昨天仍有於雲端系統收紙本文的狀況，已經電話通知。

[協調、需求或建議事項](協調機關資訊或文書窗口，決定相關事宜)

- 公所反映先前雲端系統並未限制保存年限99公文不能作線上簽核，但新系統有限制，雖為府方規定，但希望能開放。將提到02/16會議討論，有決議將另行公布。
- 公所反映希望開放批次編目作業(目前暫鎖住)。如果他們能控制編目的起始卷號及目次號，擬同意開放。

上線機關數：10 (5個公所 及 5個代表會)

一、(公文件數及主要處理問題類型說明)

電話通數：33通

系統紀錄件數：

總收文：350件(199件電子收文，151件紙本收文)

創文：162件(51件電子簽核，111件紙本簽核)

發文：80件(18件電子簽核，62件紙本簽核)

存查：148件(98件電子簽核，50件紙本簽核)

API電子交換收發文狀況

收文：209件(成功：209，失敗：0件)

發文：31件(重送總件數 0件，重送總次數0次)

[須優先處理問題] (Bugs及 上線重大問題)

1.無。



下期工作進度說明

1.	硬體到貨 及 安裝	完成安裝及測試 完成備份設定	☐ 未結案； ☒ 已結案	李盈德
2.	審查專案工作計畫書	已完成	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如
3.	衛生局需求確認會議	已完成	☐ 未結案； ☒ 已結案	黃靖文
4.	需求分析	已完成	☐ 未結案； ☒ 已結案	李盈德 林昆霖
5.	系統開發	執行中，部分完成	☒ 未結案； ☐ 已結案	林昆霖...等
6.	系統安裝與測試	執行中，部分完成	☒ 未結案； ☐ 已結案	林雅芳...等
7.	系統測試個案調整 系統種子人員測試安排及測試	12/22-23 測試 測試資料彙整完畢，無重大需調整事項	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如 李盈德
8.	教育訓練時程規劃 教育訓練安排	完成教育訓練規劃 開放報名	☐ 未結案； ☒ 已結案	陳春如 李盈德
9.	教育訓練	教育訓練進行中	☒ 未結案； ☐ 已結案	陳春如 林雅芳...等
10.	系統上線	1/24 第一梯次 36 個機關	☒ 未結案； ☐ 已結案	0800 客服專線

編號	工作項目	負責人	目前執行狀態
1.	專案月會	本府 / 李盈德	安排中
2.	需求分析(資料庫)	李盈德、林昆霖	執行中
3.	系統開發(上線問題處理)	林昆霖...等，系統工程師	執行中
4.	系統教育訓練及上線	本府 / 李盈德	持續系統教育訓練及上線



議題討論

- 機關反映，保存年限99是否可以開放線上簽核
- 二層決行，發文出現依分層負責決行字樣


以下已處理

- 公所提出增加全國各公所群組=>已經提供全國各公所 與 全國代表會群組
- 總收登記簿OPR100希望以承辦人排序
- 報表承辦人公文清單報表，新增簽核方式的欄位
- 收文簿送、歸檔單 增加承辦人 塞選條件，預設 全部

- 配合所屬機關上線版本，本府 及 警察局 改版，系統跨瀏覽器簽核元件更新



序	參數名稱	參數代碼	參數值	參數說明	系統類別	維護功能
1	ClientWorker引導正確的網址安裝元件	ClientworkerURL	http://localhost:8080/YLGWEBAP/resources/DSIC_Windows_v1.6.0.exe	ClientWorker引導正確的網址安裝元件	OE	維護 刪除
2	ClientWorker檢核簽核元件版本，控制是否啟用	ClientWorkerAutoPatch	Y	ClientWorker檢核簽核元件版本，控制是否啟用	OE	維護 刪除
3	LinuxOS使用的簽核元件版本	ClientWorkerVerLinux	1.2.1	LinuxOS使用的簽核元件版本，控制是否下載安裝檔啟動重新安裝	OE	維護 刪除
4	MacOS使用的簽核元件版本	ClientWorkerVerDarwin	1.2.1	MacOS使用的簽核元件版本，控制是否下載安裝檔啟動重新安裝	OE	維護 刪除
5	WindowsOS使用的簽核元件版本	ClientWorkerVerWindows	1.6.0	WindowsOS使用的簽核元件版本，控制是否下載安裝檔啟動重新安裝	OE	維護 刪除

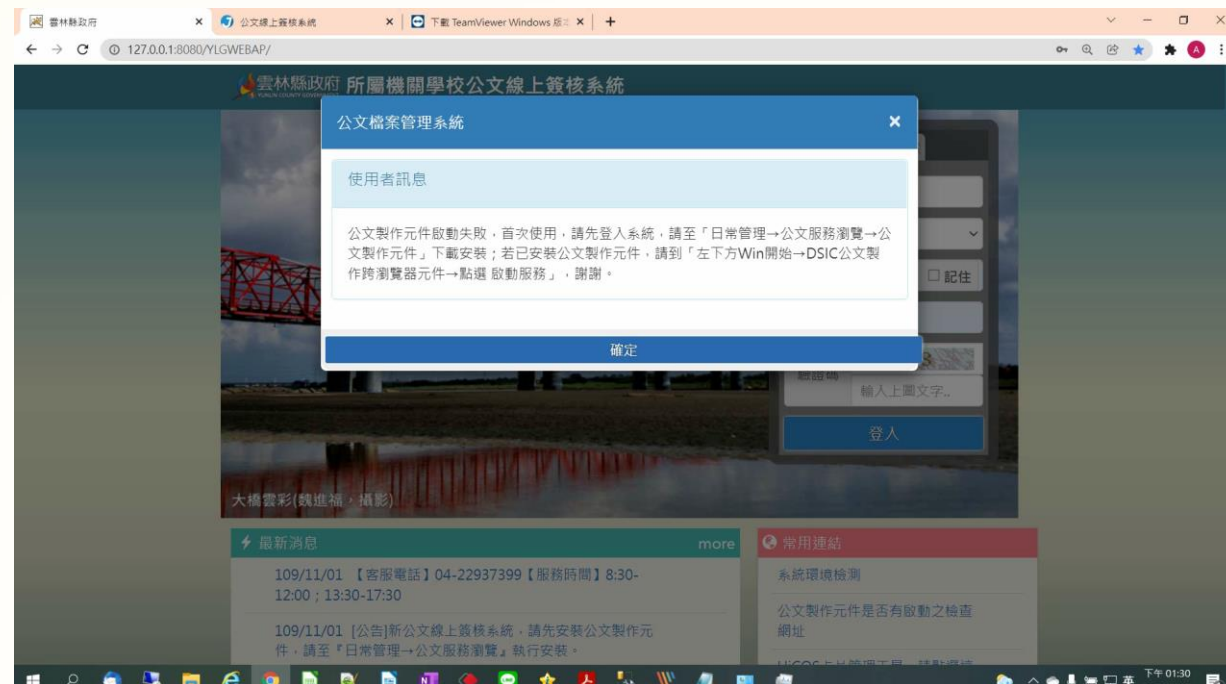



感謝聆聽

Thank you for listening.



帝緯系統整合股份有限公司
Digitware System Integration Corporation
